

ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 2023 года.

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущен отбор проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.


По итогам отборов было отобрано 127 объектов генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2028 годах, суммарный объем установленной мощности составил 26 832,2 МВт (подробнее см. рис.1), в том числе:

- первая ценовая зона 89 объектов генерации установленной мощностью 21 767,3 МВт;
- вторая ценовая зона 38 объектов генерации установленной мощностью 5 064,9 МВт.

Разделение отобранных объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 87 объектов генерации установленной мощностью 21 137,3 МВт;
- уголь – 40 объектов генерации установленной мощностью 5 694,9 МВт.


Рис. 1 Плановый объем мощности модернизируемых объектов генерации по результатам отборов, МВт.

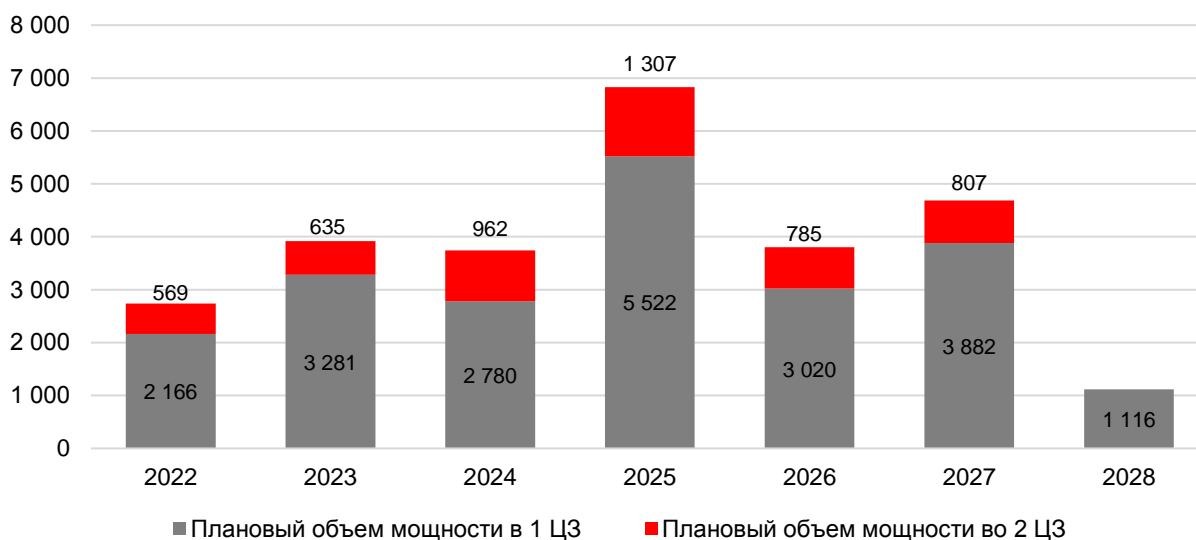

II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План вводов на 2023 год составил 10 объектов генерации установленной мощностью 2 175,9 МВт. Из запланированных на 2023 год введено 9 объектов генерации установленной мощностью 2 051 МВт. Дополнительно, в отчетном периоде введены 2 объекта генерации, запланированные к вводу на 2022 год, установленной мощностью 255 МВт. С учетом ввода объектов 2022 года исполнение плана составляет 106%.

Рис. 2 Плановый (с учетом изменения периодов модернизации и поставки мощности, а также параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

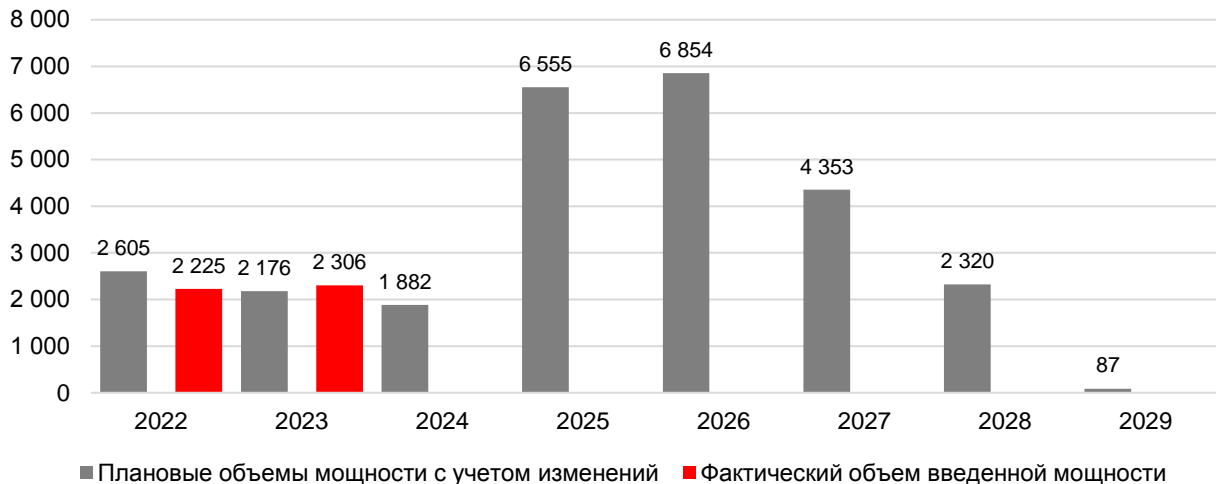

Всего за весь период до 31.12.2023 введено 20 объектов генерации установленной мощностью 4 531,4 МВт, при плане в 22 объекта генерации установленной мощностью 4 781,2 МВт. Исполнение плана составляет 94,8%.

По состоянию на 31.12.2023 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 16,9%, при общем плане ввода 127 объектов генерации суммарной установленной мощностью 26 832,2 МВт.

По состоянию на 31.12.2023 даты начала поставки мощности нарушила 1 компания по 2 объектам генерации, установленной мощностью 249,8 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 3 до 15 месяцев.

По состоянию на конец отчетного периода на стадии модернизации находится 23 объекта с установленной мощностью 4 230,8 МВт, в том числе:

- 21 объект установленной мощностью 3 981 МВт с плановым периодом модернизации;
- 2 объекта установленной мощностью 249,8 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Изменения параметров договоров в 2023 году:

- по инициативе участника внесены изменения дат начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности по 5 объектам генерации установленной мощностью 1 232 МВт;
- по инициативе АО «СО ЕЭС» и в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации изменены даты начала периода реализации проекта, начала и окончания поставки мощности по 8 объектам генерации установленной мощностью 2 287 МВт;
- осуществлена передача прав и обязанностей продавца новому продавцу по 3 объектам генерации установленной мощностью 1 053,4 МВт.

III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

Штрафов по КОММод в 2023 г. было рассчитано и списано 29,2 млн. рублей (что составляет 22,7% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022-2023 гг. было рассчитано и списано 128,5 млн. рублей (уровень оплаты – 100%).
