

ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 1 квартала 2026 года.

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций. Заключение и сопровождение договоров на модернизацию осуществляется АО «ЦФР» на основании выполнения функции Поверенного по договорам коммерческого представительства.

По итогам отборов было отобрано 154 объекта генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2031 годах, суммарный объем установленной мощности составил 31 518,2 МВт.

В результате изменений перечня и параметров объектов общее количество проектов сократилось до 135 объектов общей установленной мощностью 28 404,3 МВт (подробнее см. рис. 1),


в том числе:

- первая ценовая зона 95 объектов генерации установленной мощностью 22 609,4 МВт;
- вторая ценовая зона 40 объектов генерации установленной мощностью 5 794,9 МВт.

Разделение объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 92 объектов генерации установленной мощностью 21 664,4 МВт;
- уголь – 37 объектов генерации установленной мощностью 6 739,9 МВт.

Рис.1 Сравнение планового и скорректированного объема мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

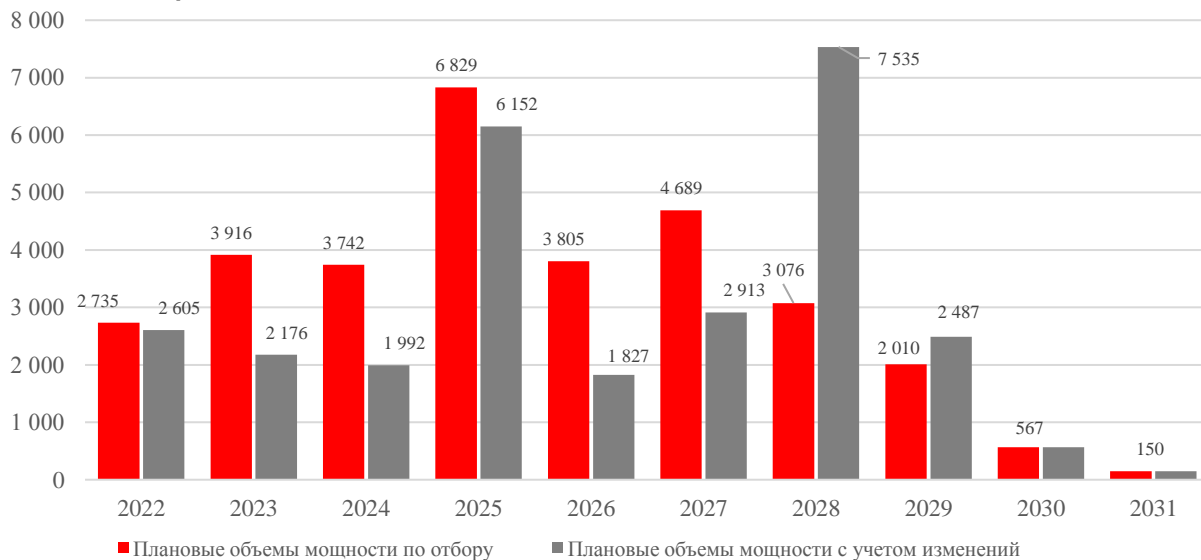


II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

План вводов на 2026 год составляет 15 объектов генерации общей установленной мощностью 1 826,8 МВт, в том числе на 1 квартал 2026 года – 4 объекта генерации общей установленной мощностью 337,9 МВт. Из запланированных на 1 квартал 2026 года введен 1 объект генерации установленной мощностью 118 МВт. Дополнительно в 1 квартале 2026 года введены 6 объектов общей установленной мощностью 1 815 МВт, запланированные к вводу в 2025 году.

Всего в 1 квартале 2026 года введены 7 объектов общей установленной мощностью 1 933 МВт. Исполнение плана 1 квартала 2026 года составляет 572%. Выполнение плана 2026 года составляет 105,8%.

Рис. 2 Плановый (с учетом изменений состава и параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

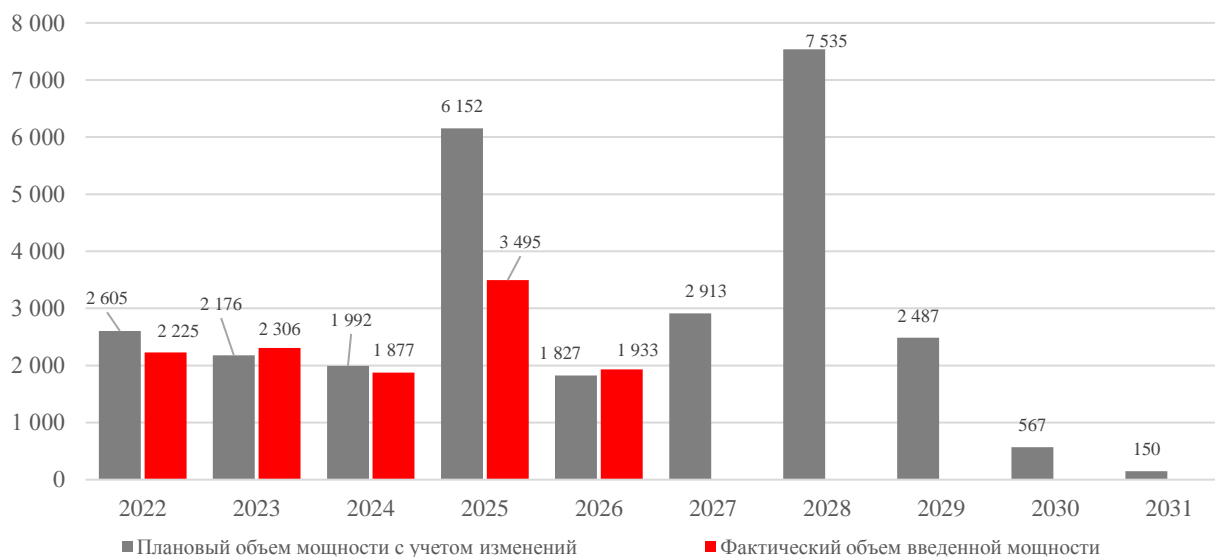

Всего по состоянию на 31.03.2026 введено 53 объекта генерации общей установленной мощностью 11 836,2 МВт, при плане в 67 объектов общей установленной мощностью 13 263,1 МВт. Исполнение плана составляет 89,24%.

По состоянию на 31.03.2026 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 41,67%, при общем плане ввода 135 объектов генерации суммарной установленной мощностью 28 404,3 МВт.

По состоянию на 31.03.2026 даты начала поставки мощности нарушили 10 компаний по 14 объектам генерации, общей мощностью 1 426,9 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 1 до 24 месяцев.

На стадии модернизации находится 26 объектов генерации общей установленной мощностью 3 028,8 МВт, в т.ч.:

- 12 объектов генерации общей установленной мощностью 1 601,9 МВт с плановым периодом модернизации;
- 14 объектов генерации общей установленной мощностью 1 426,9 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Основные изменения параметров договоров в 1 квартале 2026 года:

- По инициативе участника в 1 квартале 2026 года оформлено изменение дат начала и окончания поставки с уменьшением периода модернизации по 1 объекту генерации установленной мощностью 110 МВт и даты окончания поставки мощности по 2 объектам генерации общей установленной мощностью 125 МВт;
- В 1 квартале 2026 года проведен отбор объектов генерации КОММод (распоряжение Правительства №148-р от 31.01.2026) – отобрано 24 объекта генерации общей установленной мощностью 2 727 МВт. Также в 1 квартале 2026 года в соответствии с распоряжением Правительства №66-р от 23.01.2026 исключен 1 объект генерации установленной мощностью 150 МВт.

III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

В 1 квартале 2026 года было рассчитано и списано 75,8 млн. рублей (что составляет 1,17% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 1 квартал 2026 гг. было рассчитано 6 473,1 млн. рублей штрафов (уровень оплаты – 99,999%).
