

ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 2 квартала 2026 года

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций.

По итогам отборов было отобрано 154 объекта генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2031 годах, суммарный объем установленной мощности составил 31 518,2 МВт.

В результате изменений перечня и параметров объектов общее количество проектов сократилось до 135 объектов общей установленной мощностью 28 404,3 МВт (подробнее см. рис.1),


в том числе:

- первая ценовая зона - 95 объектов генерации установленной мощностью 22 609,4 МВт;
- вторая ценовая зона - 40 объектов генерации установленной мощностью 5 794,9 МВт.

Разделение объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 92 объекта генерации установленной мощностью 21 664,4 МВт;
- уголь – 43 объекта генерации установленной мощностью 6 739,9 МВт.

Рис.1 Сравнение планового и скорректированного объема мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

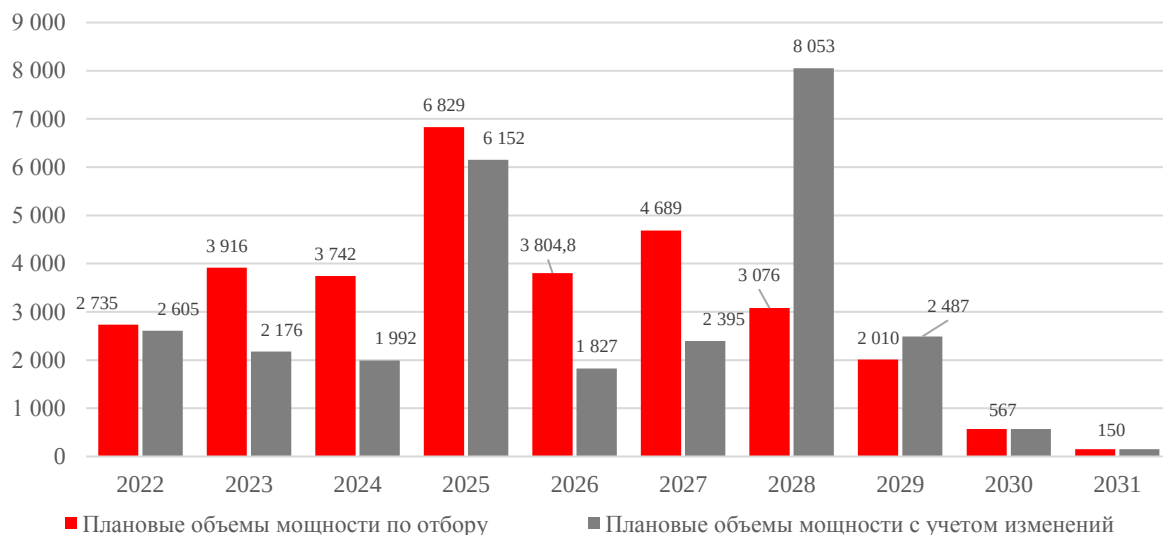


II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

На 2026 год запланирован ввод 15 объектов генерации общей установленной мощностью 1 826,8 МВт, в том числе на 2 квартал 2026 года – 3 объекта генерации общей установленной мощностью 415 МВт. Из запланированных к вводу во 2 квартале введен 1 объект генерации установленной мощностью 110 МВт, а также 1 объект генерации установленной мощностью 49,9 МВт, запланированный к вводу в 1 квартале 2026 г. Дополнительно во 2 квартале 2026 году введены 7 объектов установленной мощностью 670 МВт, запланированные к вводу в 2025 году. Всего во 2 квартале введены 9 объектов генерации общей установленной мощностью 829,9 МВт.

Всего в 2026 году введены 16 объектов общей установленной мощностью 2 762,9 МВт. Исполнение плана 1 полугодия 2026 года составляет 367%. Выполнение плана 2026 года составляет 151,2%.

Рис. 2 Плановый (с учетом изменений состава и параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

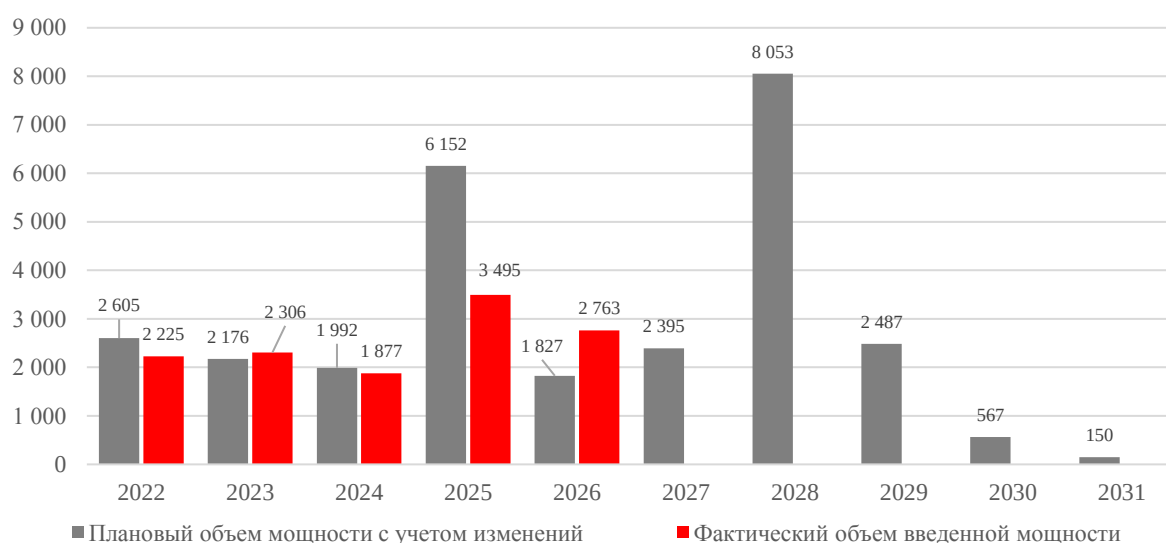

Всего по состоянию на 30.06.2026 введено 62 объекта генерации общей установленной мощностью 12 666,1 МВт, при плане в 70 объектов общей установленной мощностью 13 678,1 МВт. Исполнение плана составляет 92,6%.

По состоянию на 30.06.2026 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 44,59%, при общем плане ввода 135 объектов генерации суммарной установленной мощностью 28 404,3 МВт.

По состоянию на 30.06.2026 даты начала поставки мощности нарушили 6 компаний по 8 объектам генерации, общей мощностью 1 012 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 2 до 27 месяцев.

На стадии модернизации находится 23 объекта генерации общей установленной мощностью 3 419,9 МВт, в т.ч.:

- 15 объектов генерации общей установленной мощностью 2 407,9 МВт с плановым периодом модернизации;
- 8 объектов генерации общей установленной мощностью 1 012 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Основные изменения параметров договоров во 2 квартале 2026 года:

- По инициативе участника во 2 квартале 2026 года оформлено изменение дат начала и окончания поставки с уменьшением периода модернизации по 2 объектам генерации общей установленной мощностью 450 МВт.
- По инициативе СО во 2 квартале 2026 года были изменены периоды модернизации и поставки мощности по 2 объектам генерации общей установленной мощностью 518 МВт.

III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

Во 2 квартале 2026 года было рассчитано и списано 392,5 млн. рублей (что составляет 5,7% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 2 квартал 2026 гг. было рассчитано 6 887,9 млн. рублей штрафов (уровень оплаты – 99,999%).
