

ОТЧЕТ

о ходе реализации отобранных инвестиционных проектов участников ОРЭМ – генерирующих компаний в рамках ДПМ ВИЭ и ДПМ ТБО (за 2 кв. 2026 г.)

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности (далее – Правила оптового рынка), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 Коммерческим оператором начиная с 2013 г. проводятся конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (далее – ОПВ).

ОПВ проводится на 4 года вперед отдельно для каждого вида генерирующих объектов, функционирующих на основе использования разных видов возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ):

- фотоэлектрического преобразования энергии солнца (объект солнечной генерации);
- энергии ветра (объект ветровой генерации);
- энергии потоков воды (в том числе энергии сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электростанциях (генерирующий объект гидрогенерации).


Целевые показатели величин объемов ввода объектов ВИЭ и предельные величины капитальных затрат, используемые в целях проведения ОПВ, определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р.

Во 2 квартале 2026 г. был проведен ОПВ, в результате которого было отобрано 8 объектов ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности 2027-2032 гг., суммарный объем установленной мощности которых составил 258,706 МВт. Всего в 2026 г. отобрано объектов генерации по видам:

- 4 объекта ветровой генерации общей установленной мощностью 231,25 МВт;
- 2 объекта солнечной генерации общей установленной мощностью 17,206 МВт;
- 2 объекта гидрогенерации общей установленной мощностью 10,25 МВт.

Всего по итогам ОПВ, проведенным в 2013–2021, 2023–2026 гг., отобрано 427 объектов ДПМ ВИЭ с датой начала поставки мощности 2014-2032 гг., суммарный объем установленной мощности составил 12 804,618 МВт (подробнее см. рис.1).

Рис. 1 «Итоги ОПВ за 2013–2021, 2023–2026 гг., МВт (количество объектов)».

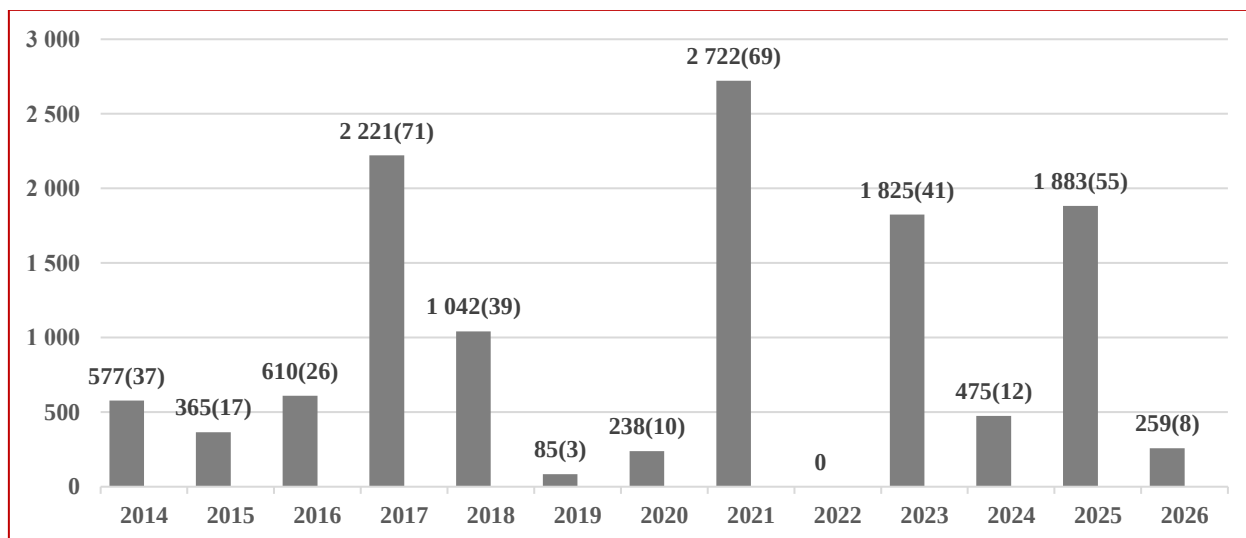

Среди отобранных объектов генерации:

- 202 объекта ветровой генерации общей установленной мощностью 7 586,699 МВт;
- 205 объектов солнечной генерации общей установленной мощностью 4 892,951 МВт;
- 20 объектов гидрогенерации общей установленной мощностью 324,968 МВт.


С учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, отказом от поставки мощности, а также учитывая изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ, общее количество объектов, планируемых к вводу в 2014-2032 гг., уменьшилось с 427 до 397 единиц, общая установленная мощность снизилась с 12 804,618 МВт до 11 845,34 МВт.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

На 2026 г. запланирован ввод 43 объектов генерации общей установленной мощностью 1 352,825 МВт.

На 2 квартал 2026 г. вводов объектов генерации не запланировано. Во 2 квартале 2026 г. введено 3 объекта ДПМ ВИЭ, запланированные к вводу в 2025 г., общей установленной мощностью 180 МВт. С начала 2026 года введено 9 объектов генерации общей установленной мощностью 370,3 МВт. С учетом вводов объектов генерации в 1 квартале 2026 г., исполнение плана 2026 г. составляет 27 %.

Рис. 2 «Плановые и фактические показатели ввода мощности (с учетом переноса даты начала поставки мощности, изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ и изменений, связанных с лишением права участия по ГТП ДПМ ВИЭ и отказом от поставки мощности), МВт».

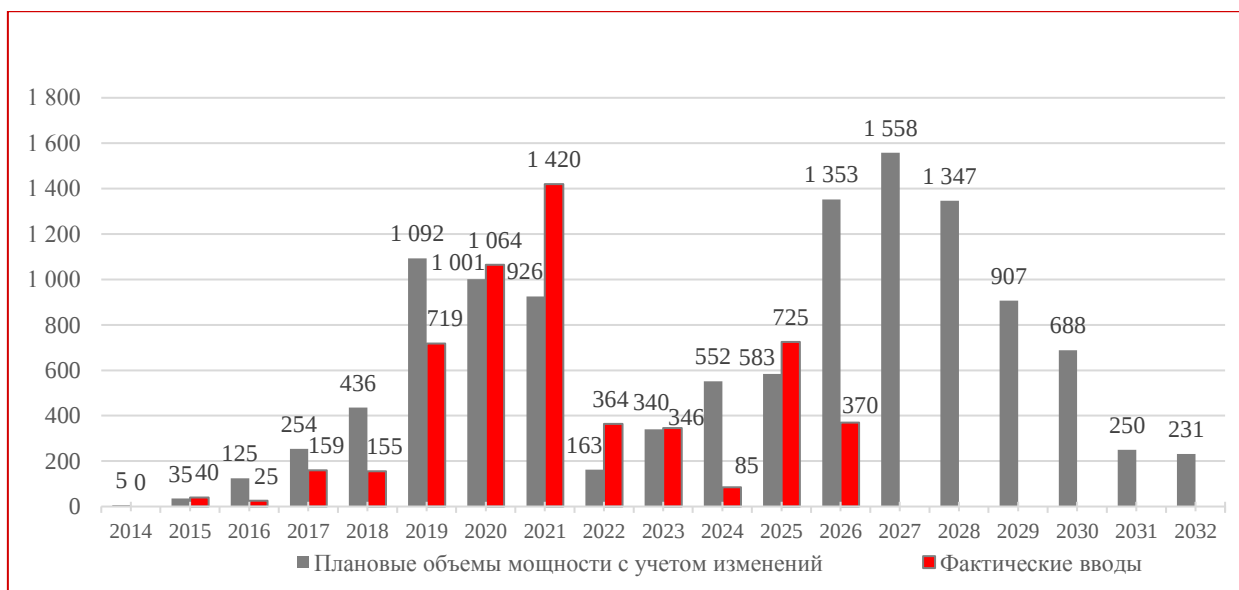

В период с 2014 г. по 2 квартал 2026 г. включительно введено 227 объектов генерации ВИЭ общей установленной мощностью 5 471,7 МВт при плане ввода 230 объектов генерации установленной мощностью 5 511,3 МВт (с учетом изменений, связанных с заменой отобранных объектов и прекращением и/или отсутствием действующих ДПМ ВИЭ, отказом от поставки мощности, а также учитывая изменения величины установленной мощности по объектам генерации ВИЭ). Исполнение плана составляет 99,3 %.

Во 2 квартале 2026 г.:

- внесены изменения в даты начала и окончания поставки мощности на более поздние по 7 объектам генерации общей установленной мощностью 206,2 МВт (в соответствии с ПП РФ от 31.10.2025 № 1704);
- внесены изменения в даты окончания поставки мощности на более поздние по 3 объектам генерации общей установленной мощностью 180 МВт (в соответствии с ПП РФ от 31.10.2025 № 1704);

- осуществлен отказ от поставки мощности 1 компанией по 1 объекту генерации ВИЭ общей установленной мощностью 49,8 МВт (в соответствии с ПП РФ от 31.10.2025 № 1704).

II. ШТРАФЫ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

За нарушение сроков начала поставки мощности по ДПМ ВИЭ в 2015 – 2 квартале 2026 гг. было рассчитано 13 998,4 млн. рублей и списано 13 998,3 млн. рублей штрафов (уровень оплаты более 99,99%).

Во 2 квартале 2026 г. было рассчитано 178,6 млн. рублей штрафов (что составляет 1,3% от общего объема рассчитанных штрафов) и списано 100% от рассчитанных во 2 квартале штрафов.

ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ) ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Особенности проведения конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации) генерирующих объектов, функционирующих на основе использования отходов производства и потребления (далее – ТБО), установлены Правилами оптового рынка.

По итогам ОПТБО, проведенного в 2017 г., отобрано 5 объектов ДПМ ТБО, суммарный объем установленной мощности которых составил 335 МВт. С учетом внесенных изменений в сроки начала и окончания поставки мощности по 5 объектам ДПМ ТБО даты поставки перенесены с 01.12.2022 г. на 01.12.2024 г.

В 2025 г. введен 1 объект генерации установленной мощностью 70 МВт.

Во 2 квартале 2026 г. ввода объектов ДПМ ТБО не осуществлялось.
