

ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов генерирующих компаний в рамках КОММод по итогам 3 квартала 2026 года

I. ОТБОРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

В 2019 году запущены отборы проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (далее - КОММод), в рамках которого осуществляется модернизация генерирующих объектов тепловых станций.

По итогам отборов было отобрано 154 объекта генерации КОММод с датой начала поставки мощности в 2022-2031 годах, суммарный объем установленной мощности составил 31 518,2 МВт.

В результате изменений перечня и параметров объектов общее количество проектов сократилось до 135 объектов общей установленной мощностью 28 404,3 МВт (подробнее см. рис. 1),


в том числе:

- первая ценовая зона - 95 объектов генерации установленной мощностью 22 609,4 МВт;
- вторая ценовая зона - 40 объектов генерации установленной мощностью 5 794,9 МВт.

Разделение объектов генерации по видам основного используемого топлива:

- газ – 92 объекта генерации установленной мощностью 21 664,4 МВт;
- уголь – 43 объекта генерации установленной мощностью 6 739,9 МВт.

Рис.1 Сравнение планового и скорректированного объема мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

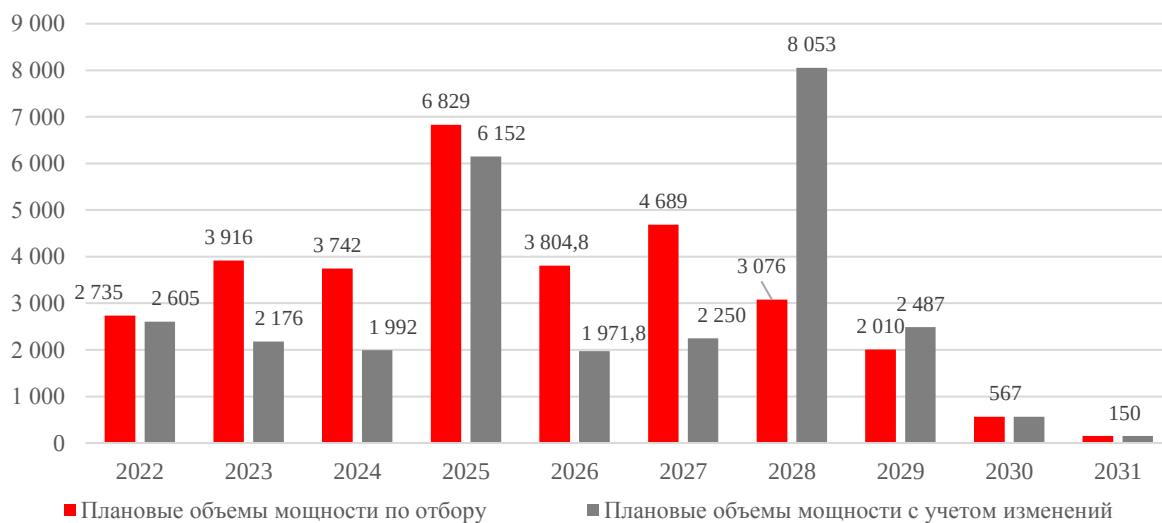


II. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВВОДУ МОЩНОСТЕЙ

На 2026 год запланирован ввод 17 объектов генерации общей установленной мощностью 1 971,8 МВт, в том числе на 3 квартал 2026 года – 2 объекта генерации общей установленной мощностью 395 МВт. Из запланированных к вводу в 3 квартале введен 1 объект генерации установленной мощностью 65 МВт, а также 1 объект генерации установленной мощностью 110 МВт, запланированный к вводу в 1 квартале 2026 года. Таким образом выполнение плана 3 квартала составило 44,3%.

Всего в 2026 году введены 18 объектов генерации общей установленной мощностью 2 937,9 МВт, в том числе 13 объектов генерации общей установленной мощностью 2 485 МВт, запланированные на 2025 год. Исполнение плана 9 месяцев 2026 года составляет 256%. Выполнение плана 2026 года составляет 149%.

Рис. 2 Плановый (с учетом изменений состава и параметров объектов) и фактический объем мощности модернизируемых объектов генерации, МВт.

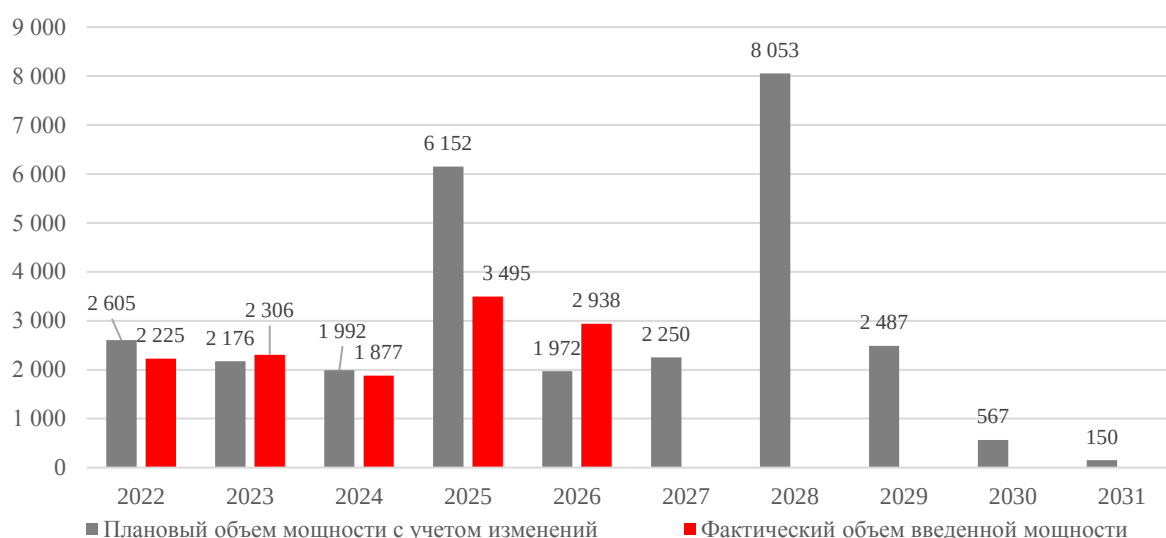

Всего по состоянию на 30.09.2026 введено 64 объекта генерации общей установленной мощностью 12 841,1 МВт, при плане в 72 объекта общей установленной мощностью 14 073,1 МВт. Исполнение плана составляет 91,3%.

По состоянию на 30.09.2026 суммарное выполнение инвестиционной программы составило 45,21%, при общем плане ввода 135 объектов генерации суммарной установленной мощностью 28 404,3 МВт.

По состоянию на 30.09.2026 даты начала поставки мощности нарушили 7 компаний по 8 объектам генерации, общей мощностью 1 232 МВт. Продолжительность нарушения по объектам составляет от 1 до 30 месяцев.

На стадии модернизации находится 24 объекта генерации общей установленной мощностью 4 254,9 МВт, в т.ч.:

- 16 объектов генерации общей установленной мощностью 3 022,9 МВт с плановым периодом модернизации;
- 8 объектов генерации общей установленной мощностью 1 232 МВт с пропущенной датой начала поставки мощности.

Основные изменения параметров договоров в 3 квартале 2026 года:

- по инициативе участника произошло изменение дат начала и окончания поставки мощности с уменьшением периода модернизации по 4 объектам установленной мощностью 575 МВт.

III. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ПО КОММОД

В 3 квартале 2026 года было рассчитано и списано 275,6 млн. рублей (что составляет 3,8% от общего объема рассчитанных штрафов). В период с 2022 – 2 квартал 2026 гг. было рассчитано 7 163,58 млн. рублей штрафов (уровень оплаты – 99,999%).
